

文件编号: ITSS-06-01-07
版 本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

发布管理制度

编制人: 耿宁 编制时间: 2025.7.3

审核人: 常海霞 审核时间: 2025.7.3

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2025.7.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.7.3	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

发布管理制度1

1. 目的 4

2. 原则 4

3. 适用范围 4

4. 岗位职责 4

 4.1. 运维项目经理 4

 4.2. 运维实施工程师 4

5. 发布管理流程 4

 5.1.1. 制定发布方案5

 5.1.2. 发布方案评审 6

 5.1.3. 构建测试环境、测试和验收6

 5.1.4. 上线规划 6

 5.1.5. 上线审批 6

 5.1.6. 沟通和培训 6

 5.1.7. 分发和部署 7

 5.1.8. 发布回退 7

 5.1.9. 发布关闭 7

 5.1.10. 发布报告 7

 5.2. 考核指标8

6. 附则 8

7. 附件 8

8. 记录 8

1. 目的

为达到规范服务组件发布流程、确保交付质量、有效控制变更风险及保障业务连续稳定运行的目的，特制定此制度。

2. 原则

发布管理原则应遵循流程标准化、风险可控化、审批规范化，确保所有发布活动经充分测试、授权及备有回退方案。

3. 适用范围

公司部署的信息系统版本升级发布，包括信息系统集成项目和软件运维项目

4. 岗位职责

4.1. 运维项目经理

1. 负责发布流程所有具体活动的协调、监控工作；制定发布计划，
2. 负责编写《发布报告》和《发布评估报告》；
3. 负责发布的审批；对发布流程定期进行回顾，进行优化改善


4.2. 运维实施工程师

1. 负责对系统的软、硬件系统功能的编译实现、产品包的制作，负责系统的安装、调试等实施工作。
2. 负责分配版本，建立配置库
3. 负责进行发布相关内容的配置检查和配合工作。、
4. 执行单元程测试，对缺陷进行记录
5. 负责分配版本，建立配置库
6. 负责进行发布相关内容的配置检查和配合工作。

5. 发布管理流程

发布流程如5-1所示

图 5-1 发布管理流程

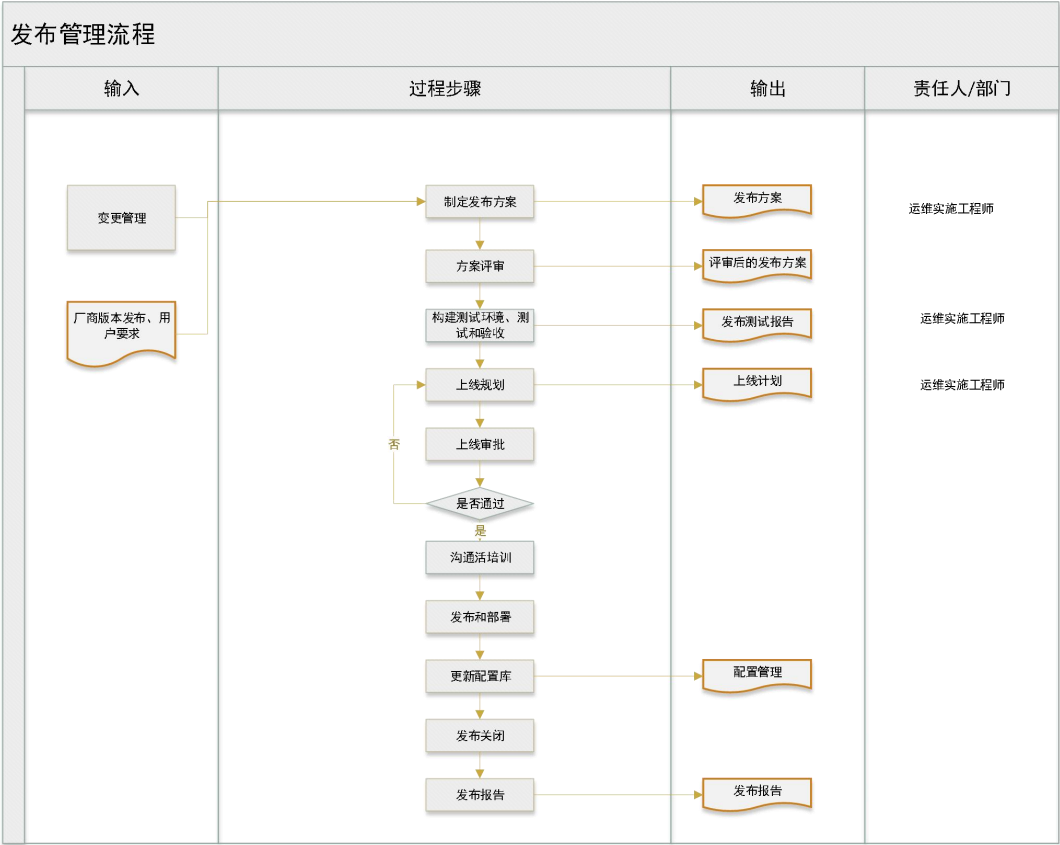

流程说明

5.1.1. 制定发布方案

1. 运维实施工程师根据变更计划制定《发布方案》，发布方案一般包括：
- (1) 描述发布的目的和背景；
 - (2) 描述发布影响范围；
 - (3) 确定参与发布的部门及人员；
 - (4) 对客户和服务支持人员的交流、准备、备案和培训；
 - (5) 确定测试、培训、客服支持、现场部署等工作计划，包含上线规划；
 - (6) 安排部署完成的后续工作计划；
 - (7) 确定在发布失败情况下的退回方案；
 - (8) 可预见问题以及相应的解决方法；
 - (9) 确定与软、硬件有关的配置基线。

5.1.2. 发布方案评审

由运维实施工程师牵头，各发布有关部门负责人参与评审发布方案，评审通过后实施。

5.1.3. 构建测试环境、测试和验收

1. 根据方案，在实施之前如果需要内部测试，需要运维实施工程师根据发布方案搭建测试环境。内部测试，包括软件功能测试以及安装流程等方面的测试。测试完成后则完成系统程序的验收。测试和验收结果将在《发布测试报告》中体现。测试结果得到运维部经理与研发部经理认可后安排上线。

5.1.4. 上线规划

1. 通常情况下发布方案包括上线计划，即在发布方案中已经确定了上线计划，个别重大发布可对原有《发布方案》中计划的拓展，其中要说明安装和测试预期结果，并制作详细的上线时间安排、工作安排和详细的上线步骤、回退计划等。

5.1.5. 上线审批

1. 通常情况下《发布方案》包含《上线计划》，因此在方案审批时已对《上线计划》也同时确认。
2. 若有单独制作《上线计划》的，由运维实施工程师提交运维部经理审核确认后发布。

5.1.6. 沟通和培训

3. 系统版本升级部署前，需要对服务支持人员进行沟通、知识更新培训，保障发布后的客服支持工作；需要对企业用户相关人员进行沟通和培训，发布上线通知，使得用户明确软件上线后对其工作有何影响，必要时对用户进行培训。

5.1.7. 分发和部署

1. 经过环境构建、测试和试运行后，可进行软件的上线部署工作。
2. 更新配置库
3. 发布实施完成后，运维实施工程师更新配置库的配置项信息。
4. 参照《配置管理过程》。

5.1.8. 发布回退

如果发布失败，需要进行发布回退步骤

应用回滚：将应用版本快速切换至上一稳定版本。

数据回退：若发布涉及数据库结构或数据迁移，执行预制的数据回退脚本或恢复备份。

配置还原：将所有相关配置项恢复至发布前状态。

验证与恢复：验证回退后系统核心功能与数据一致性。服务台/监控确认服务恢复后，向用户发送恢复通知。

复盘与改进：发布后 24小时内 进行复盘，分析失败原因，优化发布与回退方案。

5.1.9. 发布关闭

1. 运维实施工程师整理发布资料，对资料归档，最后关闭。

5.1.10. 发布报告

1. 发布完成后，每季度对用户提出的因为升级导致的错误或问题，由技术人员收集如下的信息：
2. 发布引起的事件或问题数量；
3. 发布成功率
4. 对发布数据进行分析，找出存在的问题，并提出纠正或预防措施，编写出《发布报告》，成为服务报告的一部分。

5.2. 考核指标

指标度量性	计算方式	频次	指标要求
发布实施成功率	发布实施成功总数/发布实施总数*100%	每季度	≥95%

6. 附则

- 1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
- 2. 本制度自颁布之日起施行。

7. 附件

《变更管理制度》

《配置管理制度》

8. 记录

《发布方案》

《发布测试报告》

《发布报告》
